



19	Kreuzpointner	Do, 11.03.21	Fr, 09.04.21	Deckenmontage/Verkofferungen	20 Tage
20	Schick Bau	Mo, 15.03.21	Fr, 16.04.21	Schluckbrunnen, FU Treppe, Aussenanlagen	23 Tage
21	Deser	Mo, 15.03.21	Fr, 19.03.21	Anschluss Wärmepumpe, Mischventile usw. n. Kabelplan	5 Tage
22	Mescado	Mo, 15.03.21	Fr, 02.04.21	Fertigstellung Regeltechnik	14 Tage
23	Ackermann	Mo, 22.03.21	Fr, 02.04.21	Einbau Abzughaube und Lüftung Küche	9 Tage
24	Eigenleistung Maler	Mi, 24.03.21	Fr, 26.03.21	Malerarbeiten GK-Decken Bauteil 2 UG und EG	3 Tage
25	Stedo	Mo, 29.03.21	Fr, 02.04.21	Anschluss Wärmepumpe, Mischventile und Schluckbrunnen	4 Tage
26	Linzmeier	Mo, 29.03.21	Fr, 07.05.21	Fliesen beginnend mit BT 2	28 Tage
27	Metallbau Schlicker	Mo, 29.03.21	Fr, 16.04.21	Aussentreppe	13 Tage
28	Wiesenbart	Mo, 12.04.21	Fr, 14.05.21	Bodenleger	24 Tage
29	AZ Metallbau	Mo, 19.04.21	Fr, 07.05.21	Überdachung Terrasse	15 Tage
30	Schick Bau	Mo, 22.03.21	Fr, 16.04.21	Schluckbrunnen, Kanalanschluss, Entwässerung	18 Tage
31	Eder	Mo, 17.05.21	Fr, 21.05.21	Innentüren	5 Tage
32	Stedo / Ackermann	Mo, 10.05.21	Fr, 28.05.21	Feininstallation HLS	13 Tage
33	Deser	Mo, 10.05.21	Fr, 28.05.21	Feininstallation ELT	13 Tage
34	Chiemsee Kälte	Mo, 10.05.21	Fr, 14.05.21	Einbau Kühlzelle Küche	4 Tage
35	Kapfelsperger	Mo, 17.05.21	Fr, 28.05.21	Einbau Küche	9 Tage
36	Baumgartner	Mo, 17.05.21	Fr, 28.05.21	Einbau Brandschutztüren	9 Tage
37	Eigenleistung Aussenanlagen	Mo, 19.04.21	Fr, 21.05.21	Eigenleistung	24 Tage
38		Mo, 07.06.21	Fr, 25.06.21	Restarbeiten aller Gewerke	15 Tage
39		Mo, 28.06.21	Mi, 30.06.21	Übergabe	3 Tage

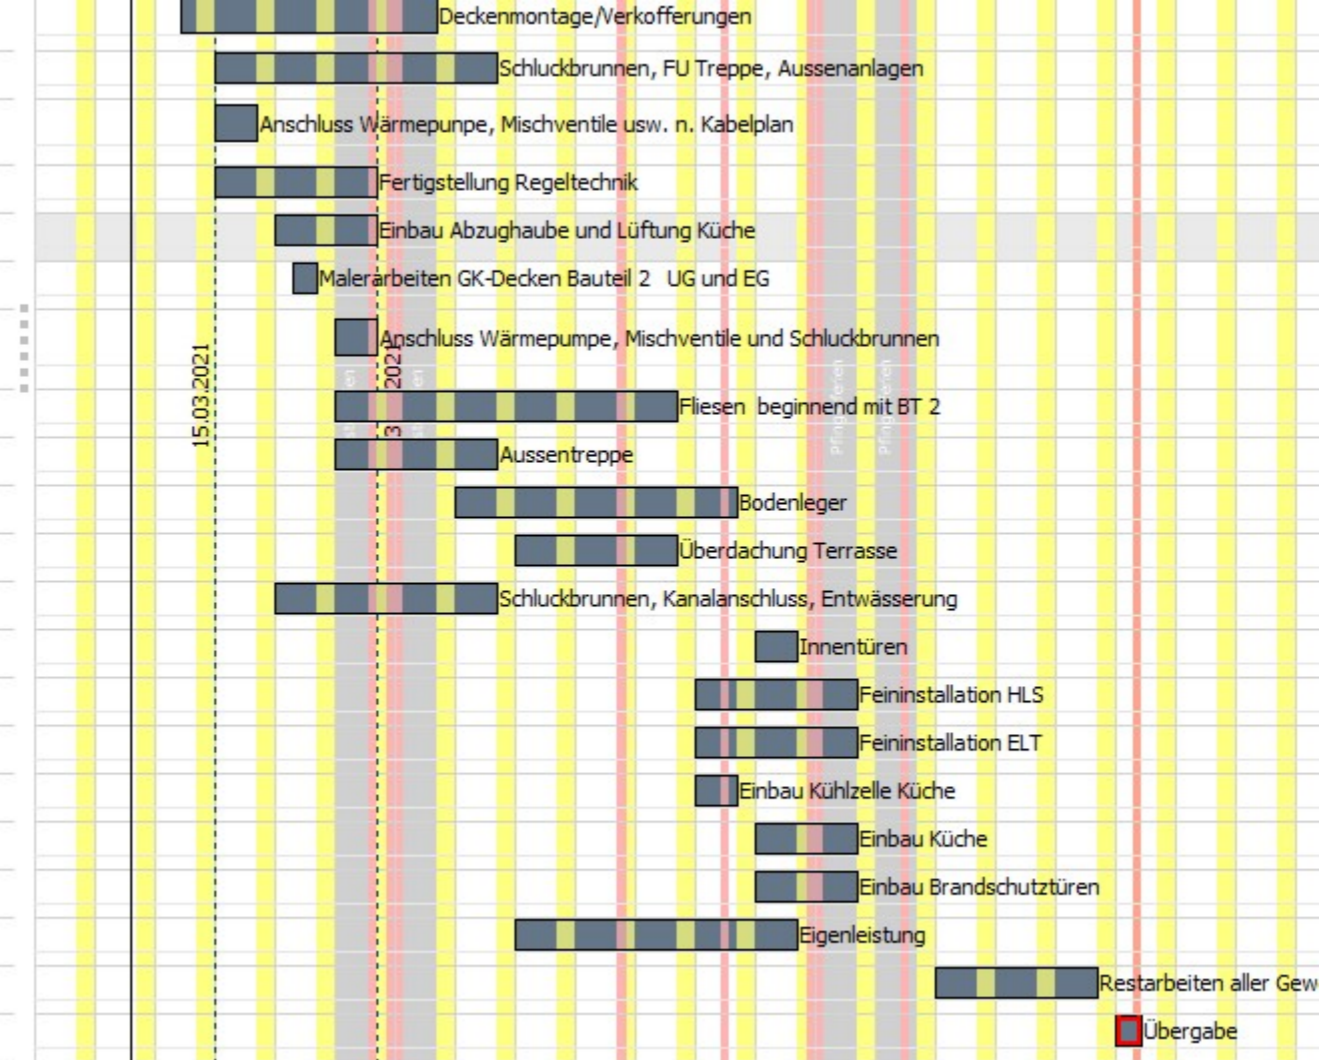



erke
